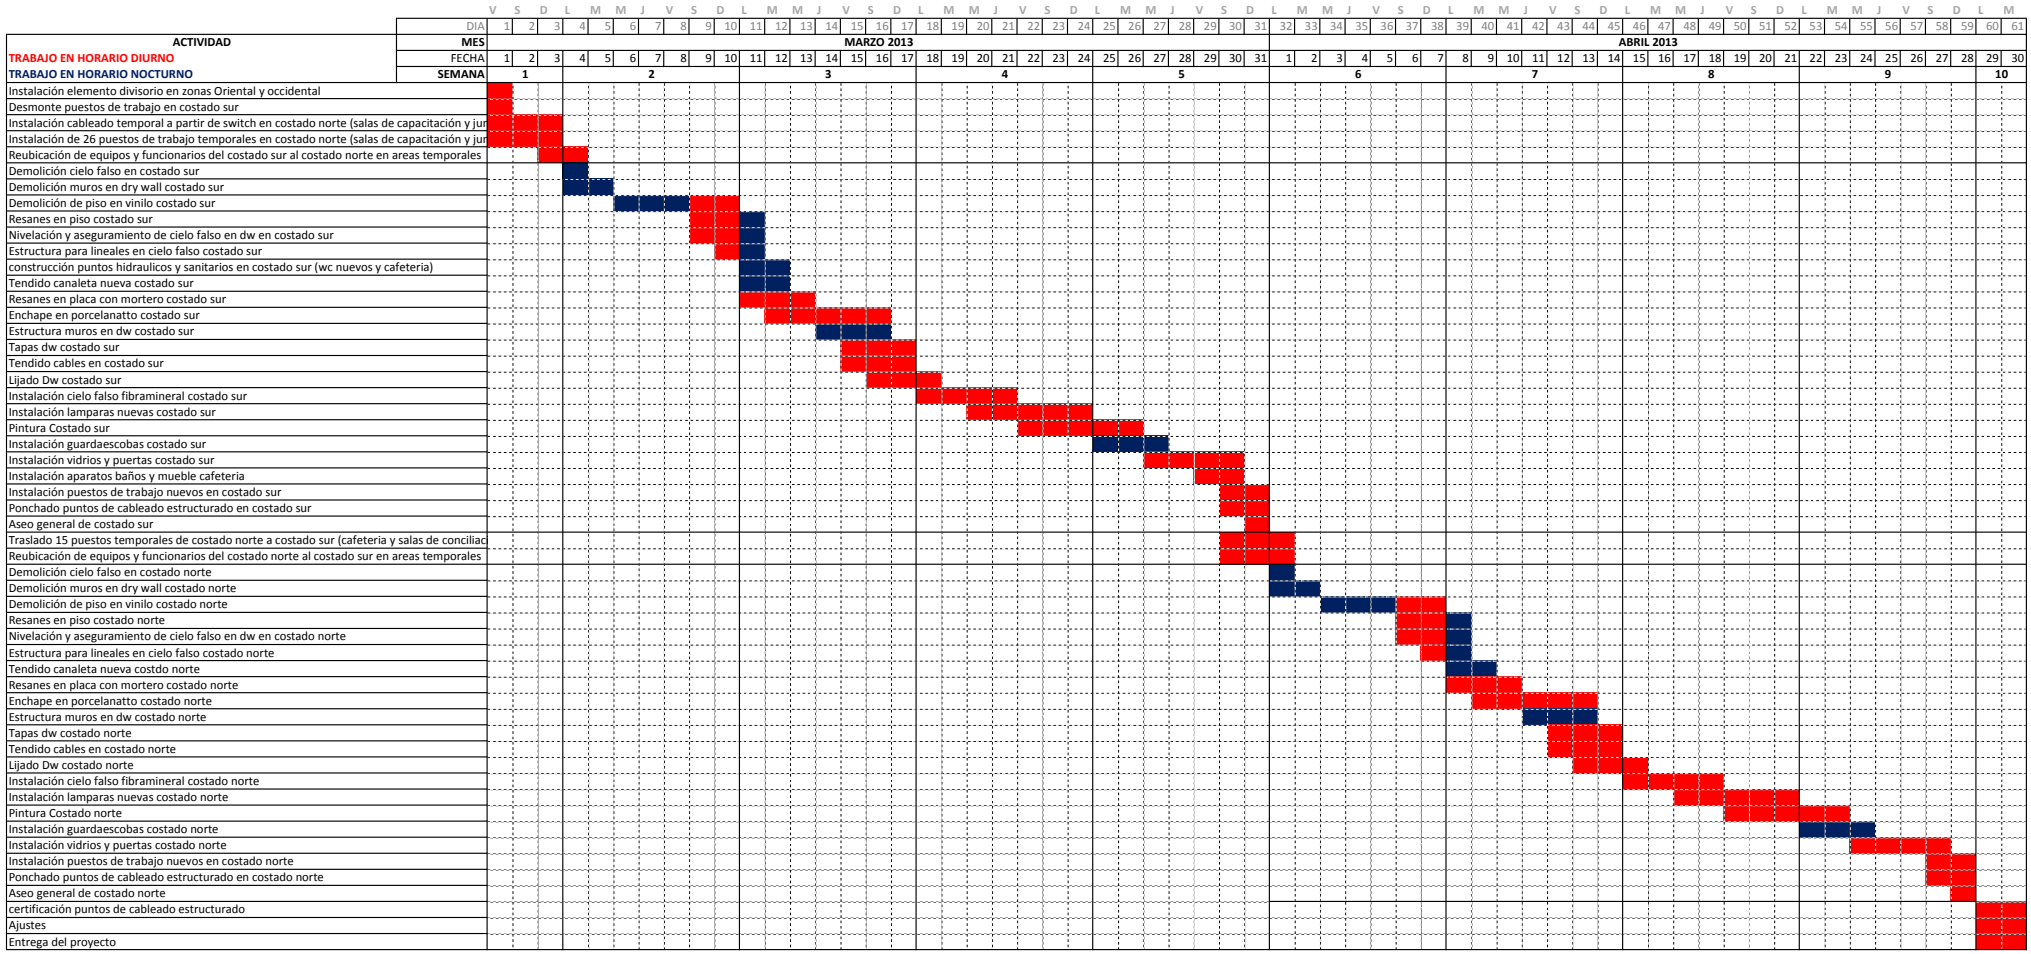
ACTIVIDAD
TRABAJO EN HORARIO DIURNO
TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO
DIA
MES
FECHA
SEMANA
MARZO 2013
ABRIL 2013
Instalación elemento divisorio en zonas Oriental y occidental
Desmonte puestos de trabajo en costado sur
Instalación cableado temporal a partir de switch en costado norte (salas de capacitación y jun
Instalación de 26 puestos de trabajo temporales en costado norte (salas de capacitación y jun
Reubicación de equipos y funcionarios del costado sur al costado norte en areas temporales
Demolición cielo falso en costado sur
Demolición muros en dry wall costado sur
Demolición de piso en vinilo costado sur
Resanes en piso costado sur
Nivelación y aseguramiento de cielo falso en dw en costado sur
Estructura para lineales en cielo falso costado sur
construcción puntos hidraulicos y sanitarios en costado sur (wc nuevos y cafeteria)
Tendido canaleta nueva costado sur
Resanes en placa con mortero costado sur
Enchape en porcelanatto costado sur
Estructura muros en dw costado sur
Tapas dw costado sur
Tendido cables en costado sur
Lijado Dw costado sur
Instalación cielo falso fibramineral costado sur
Instalación lamparas nuevas costado sur
Pintura Costado sur
Instalación guardaescobas costado sur
Instalación vidrios y puertas costado sur
Instalación aparatos baños y mueble cafeteria
Instalación puestos de trabajo nuevos en costado sur
Ponchado puntos de cableado estructurado en costado sur
Aseo general de costado sur
Traslado 15 puestos temporales de costado norte a costado sur (cafeteria y salas de conciliac
Reubicación de equipos y funcionarios del costado norte al costado sur en areas temporales
Demolición cielo falso en costado norte
Demolición muros en dry wall costado norte
Demolición de piso en vinilo costado norte
Resanes en piso costado norte
Nivelación y aseguramiento de cielo falso en dw en costado norte
Estructura para lineales en cielo falso costado norte
Tendido canaleta nueva costdo norte
Resanes en placa con mortero costado norte
Enchape en porcelanatto costado norte
Estructura muros en dw costado norte
Tapas dw costado norte
Tendido cables en costado norte
Lijado Dw costado norte
Instalación cielo falso fibramineral costado norte
Instalación lamparas nuevas costado norte
Pintura Costado norte
Instalación guardaescobas costado norte
Instalación vidrios y puertas costado norte
Instalación puestos de trabajo nuevos en costado norte
Ponchado puntos de cableado estructurado en costado norte
Aseo general de costado norte
certificación puntos de cableado estructurado
Ajustes
Entrega del proyecto
